

巴音郭楞蒙古自治州和硕县 2021年预算绩效评价报告

项目名称：曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目

项目单位：和硕县曲惠镇人民政府

主管部门：和硕县乡村振兴局（扶贫办）

委托单位：和硕县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

摘要

一、项目概述

（一）项目概况

曲惠镇成立于1984年7月，其前身是塔哈其公社曲惠大队。镇下辖3个行政村、13个村民小组，由汉、蒙、维、回等4个民族构成。全镇有贫困人口160户，由于人口多，农民经济薄弱，无支柱产业脱贫，没有产业带动脱贫，现曲惠镇人民政府为发展壮大村集体经济，对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建。因此，2021年和硕县财政局安排和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目资金89.6万元，用于安装管网电缆，购买变压器、粉碎机，建设菌种培育架，新建发菌室等。

（二）项目实施情况

根据巴财农〔2020〕46号-新财扶〔2020〕40号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金预算，2021年3月-2021年6月榆树园村菌种厂二期项目完成了榆树园村菌种厂现有设施扩建，包括建设300平方米的发菌室，安装管网电缆，购买型号为160KV·A变压器、粉碎机，建设44架菌种培育架（菌架单个高2米、长1米、宽1米）。

（三）绩效目标

1. 总目标

为发展壮大集体经济，对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建，包括安装管网电缆，购买型号为160KV.A变压器、粉碎机，建设44架菌种培育架（菌架单个高2米、长1米、

宽 1 米)，新建 300 平方米的发菌室。该项目实施后，可有效提高菌种厂菌种的培育能力，增加榆树园村承包收入，预计每年增加收入 7.2 万元，提高脱贫户分红比例，提高脱贫户收入，同时还可以带动其他乡镇发展食用菌产业。

2. 年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表 1-1 2021 年和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	菌种厂建设面积	≥ 300 平方米
		建设菌种培育架数量	≥ 44 架
		安装变压器	≥ 160KV. A
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	工程（项目）开工时间	2021 年 3 月
		工程（项目）完工时间	2021 年 6 月
		项目（工程）完成及时率	=100%
	成本指标	菌种厂建设成本	≤ 799378. 98 元
		室外附属工程成本	≤ 95355. 24 元
效益指标	经济效益指标	增加榆树园村承包收入	≥ 7.2 万元
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥ 15 户
	可持续影响指标	工程使用年限	≥ 10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥ 96%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对

《2021 年和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期》项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 99.26 分，评价等级为“优”。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.65	98.25%
过程	20	19.61	98.05%
产出	40	40	100.00%
效益	20	20	100.00%
合计	100	99.26	99.26%

（二）预算执行情况

2021 年度和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目资金 89.60 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出 89.32 万元，项目完工后，和硕县财政局收回该项目结余资金 0.28 万元，资金执行率 99.68%。

（三）项目绩效情况

为农户增加收入，提高村级集体经济水平。2021 年和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目实施后，有效提高榆树园村菌种厂菌种的培育能力，增加榆树园村承包费收入，每年增加收入 7.2 万元，榆树园村集体将产生的效益以补贴购买菌包的形式让农户受益，增加蘑菇种植规模，提高贫困户收入，同时还带动了其他乡镇发展食用菌产业。和硕县曲惠镇榆树园村利用林业废料打粉、装包、出菇后，菌包回收到田地生成农业肥料，循环利用。促进了和硕县曲惠镇榆树园村各种资源的优化整合，提高了曲惠镇榆树园村村级集体经济水平。

三、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

财务管理制度比较为健全，资金支出合规。和硕县曲惠镇人民政府根据《内部财务管理制度》使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。和硕县曲惠镇人民政府有相应的财务管理制度，且合法、合规。

招标过程规范，合同管理完备，但项目资料不完整。和硕县曲惠镇人民政府按规定进行了前期的采购需求论证，并经过专家论证、该县财政局采购办批复确定采购方式为公开招标，项目程序合法、合规，合同管理规范、完备。但根据调研发现该项目资料存在不完整情况，缺少针对此专项的业务管理制度和考核机制的资料。

(二) 存在的问题与不足

1. 绩效目标设置不够完善

根据曲惠镇人民政府所提供的项目目标表显示，本项目绩效目标设置不够完善，存在以下问题：其一是数量指标“安装变压器”指标值“ $\geq 160KV.A$ ”，这里的指标值根据项目实际情况应该应填写数量而不是型号。其二是该项目有采购设备变压器，但项目绩效目标表的产出指标、效益指标与满意度指标并未设置有关采购设备的指标，建议产出指标、效益指标与满意度指标应增加有关采购设备的指标。

2. 档案管理机制不健全

曲惠镇人民政府榆树园村菌种厂二期项目档案管理机

制不健全。根据调研发现，2021年度曲惠镇人民政府项目管理过程较规范，但仍然存在个别问题，在曲惠镇人民政府提供的材料中，缺少该项目专项的业务管理制度、考核机制等资料。

（三）建议和改进措施

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标设置合理性不足的问题，建议和硕县曲惠镇人民政府加强项目目标研究和学习，提升绩效目标的管理水平。其次，建议和硕县财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，同时主管部门要进一步加大绩效目标审核力度，提升绩效目标的编制水平。

2.加强并完善项目档案的管理

建议项目实施单位要严格遵守项目管理制度规定，同时做好资料留存及档案整理工作。根据该单位出现的项目档案管理机制不健全的问题，建议从以下几个方面完善：其一理顺各部门间相互有序的衔接关系，能够重点加强该单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行；其二规范项目档案标准，项目档案在填写过程中，必须要做到填写标准化，明确各方责任，确保项目档案的完整性，实现项目档案价值，且建立相应的项目档案管理制度，不断提高项目档案管理工作的标准化建设进程。

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容及规模.....	1
(三) 资金来源及使用情况.....	2
(四) 项目组织与资金管理情况.....	2
(五) 项目绩效目标.....	4
二、评价工作概述.....	5
(一) 评价目的与原则.....	5
(二) 评价方法.....	5
(三) 绩效评价指标体系.....	6
(四) 评价组织实施.....	7
三、评价结论.....	8
四、绩效评价分析.....	10
(一) 绩效目标分析.....	10
(二) 项目管理分析.....	11
(三) 项目绩效分析.....	12
五、存在问题.....	12
六、管理建议.....	13
七、其他需要说明的问题.....	14
附件一 综合评分表.....	15
附件二 数据需求表.....	24
附件三 访谈报告.....	25

附件四 满意度调查问卷分析.....	29
附件五 满意度调查问卷.....	34
附件六 现场照片.....	36

和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景

曲惠镇成立于 1984 年 7 月，其前身是塔哈其公社曲惠大队。镇下辖 3 个行政村、13 个村民小组，由汉、蒙、维、回等 4 个民族构成。全镇有贫困人口 160 户，由于人口多，农民经济薄弱，无支柱产业脱贫，没有产业带动脱贫，现曲惠镇人民政府为发展壮大村集体经济，对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建。因此，2021 年和硕县财政局安排和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目资金 89.6 万元，用于安装管网电缆，购买变压器、粉碎机，建设菌种培育架，新建发菌室等。

(二) 项目内容及规模

1. 项目内容及规模

为发展壮大村集体经济，对榆树园村菌种厂现有设施进行改扩建，包括安装管网电缆，购买型号为 160kv·A 变压器、粉碎机，建设 44 架菌种培育架（菌架单个高 2 米、长 1 米、宽 1 米），新建 300 平方米的发菌室（钢架结构、10 公分厚的岩棉彩钢板房）。本项目总投资 89.60 万元，工程施工支出 89.32 万元。

2. 评价时段

本次和硕县 2021 年曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目资金的评价时段为：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

2021年，巴财农〔2020〕46号-新财扶〔2020〕40号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金预算，用于榆树园村菌种厂二期项目。本项目总投资89.60万元，工程施工支出89.32万元，项目完工后，和硕县财政局收回该项目结余资金0.28万元，截止2021年12月31日实际支付榆树园村菌种厂二期项目89.32万元，资金执行率99.68%。项目资金用于完成2021年和硕县曲惠镇榆树园村对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建，包括安装管网电缆，购买安装型号为160KV·A变压器、粉碎机，建设44架菌种培育架（菌架单个高2米、长1米、宽1米），新建300平方米的发菌室。资金支出明细情况详见下表1-1。

表 1-1 专项资金使用情况统计表

序号	支出内容	执行数（万元）
1	直接支付曲惠镇榆树园村菌种厂项目30%款	26.81
2	直接支付曲惠镇人民政府菌种二期项目款	35.75
3	直接支付曲惠镇榆树园村菌种厂二期款	26.76
	合计	89.32

(四) 项目组织与资金管理情况

1. 项目组织情况

本项目涉及部门为和硕县财政局、和硕县乡村振兴局（扶贫办）、和硕县曲惠镇人民政府、新疆华玺建设工程有限公司及相关部门。各部门主要职责如下：

和硕县财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项

目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

和硕县乡村振兴局（扶贫办）：主要负责承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管，管好用好衔接资金；负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

和硕县曲惠镇人民政府：组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

新疆华玺建设工程有限公司：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

2. 资金管理情况

预算编制：本专项资金预算由和硕县曲惠镇人民政府根据巴财农〔2020〕46号-新财扶〔2020〕40号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金预算文编制方案，具体支出内容根据预算安排进行测算，由和硕县曲惠镇人民政府编制预算上报和硕县财政局，预算经审议后批复。

资金拨付：本项目资金由和硕县财政局下拨至和硕县曲惠镇人民政府，资金支付由和硕县财政局通过国库支付中心

直接支付，和硕县曲惠镇人民政府依据项目实施方案和资金管理办法规使用项目资金，确保资金专款专用，有利于实现项目预期目标。

(五) 项目绩效目标

1. 总目标

为发展壮大集体经济，对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建，包括安装管网电缆，购买型号为 160KV.A 变压器、粉碎机，建设 44 架菌种培育架（菌架单个高 2 米、长 1 米、宽 1 米），新建 300 平方米的发菌室。该项目实施后，可有效提高菌种厂菌种的培育能力，增加榆树园村承包收入，预计每年增加收入 7.2 万元，提高脱贫户分红比例，提高脱贫户增加收入，同时还可以带动其他乡镇发展食用菌产业。

2. 年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表 1-2 和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	菌种厂建设面积	≥ 300 平方米
		建设菌种培育架数量	≥ 44 架
		安装变压器	≥ 160KV. A
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	工程（项目）开工时间	2021 年 3 月
		工程（项目）完工时间	2021 年 6 月
		项目（工程）完成及时率	=100%
	成本指标	菌种厂建设成本	≤ 799378. 98 元
		室外附属工程成本	≤ 95355. 24 元

效益指标	经济效益指标	增加榆树园村承包收入	≥7.2 万元
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥15 户
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥96%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对和硕县 2021 年曲惠镇人民政府“曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对榆树园村菌种厂承包收入所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区、地州有关政府部门制定的曲惠镇榆树园村菌种厂的相关的政策文件，了解本专项资金政策内容、目标，以及上级的相关产业规划，考察本专项资金设立与国家、自治区相关战略规划是否匹配。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评

价组首先将本项目总目标与上级战略规划进行对比，分析总目标与战略规划的匹配性；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定

目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于〈印发自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为和硕县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查、调查取数、撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	张琳娜	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	张梦梦	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	喻盼盼	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月

31日，具体安排如下：

（1）数据采集（2022年8月5日前）受和硕县财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）线上调研（2022年8月13日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成调查报告。

（3）撰写评价报告（2022年8月20日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

（4）报告提交（2022年8月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和硕县财政局，并根据和硕县财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对《和硕县2021曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目》项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为99.26分，评价等级为“优”，各部分得分情况详见下表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
------	-----	----	-----

决策	20	19.65	98.25%
过程	20	19.61	98.05%
产出	40	40	100.00%
效益	20	20	100.00%
合计	100	99.26	99.26%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	合理	较合理	4.75	95.00%
		A202 绩效指标明确性	4	明确	较明确	3.9	97.50%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	合理	合理	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
B 过程 (20)	B1 资金管理 (14)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100.00%
		B102 预算执行率	6	100%	99.69%	5.98	99.67%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100.00%
	B2 组织实施 (6)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	3	有效	较有效	2.63	87.67%
C 产出 (40)	C1 产出数量 (19)	C101 菌种厂建设面积	4	≥300 平方米	300 平方米	4	100.00%
		C102 建设菌种培育架数量	5	≥44 架	44 架	5	100.00%
		C103 安装变压器	4	≥160KV·A	160KV·A	4	100.00%
	C2 产出质量 (9)	C201 项目验收合格率	5	100%	100%	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
	C3 产出时效 (3)	C301 工程 (项目) 开工时间	4	2021 年 3 月 15 日	2021 年 3 月 15 日	4	100.00%
		C302 工程 (项目) 完工时间	5	2021 年 6 月 15 日	2021 年 6 月 15 日	5	100.00%
		C303 项目 (工程) 完成及时率	4	100%	100%	4	100.00%
	C4 产出成本 (9)	C401 菌种厂建设	5	≤799378.98 元	799378.98 元	5	100.00%
		C402 室外附属工程	4	≤95355.24 元	95355.24 元	4	100.00%
D 效益 (20)	D1 项目效益 (15)	D101 增加榆树园村承包收入	5	≥7.2 万元	7.2 万元	5	100.00%
		D102 受益脱贫人口数	5	≥15 户	15 户	5	100.00%
		D103 工程使用年限	5	≥10 年	10 年	5	100.00%
	D2 满意度 (5)	D201 受益脱贫人口满意度	5	≥95%	97%	5	100.00%
总分			100	-	-	99.26	99.26%

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

部分绩效目标设置缺乏合理性，绩效目标设置不完整。年度绩效目标可实现、有时间限制，与实际工作具有相关性，并且与预算确定的项目投资额相匹配。但存在以下问题：其一是数量指标“安装变压器”指标值“≥160KV.A”缺乏合理性，这里的指标值根据项目实际情况应该应填写数量而不是型号。其二是根据曲惠镇人民政府所提供的项目目标表显示，本项目绩效目标设置不完整，该项目有采购设备变压器，但项目绩效目标表的产出指标、效益指标与满意度指标并未设置有关采购设备的指标。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标问题
产出指标	数量指标	菌种厂建设面积	≥300 平方米	--
		建设菌种培育架数量	≥44 架	--
		安装变压器	≥160KV. A	指标值设置不合理，指标值不应写型号
	质量指标	项目验收合格率	=100%	--
	时效指标	工程（项目）开工时间	2021 年 3 月	--
		工程（项目）完工时间	2021 年 6 月	--
		项目（工程）完成及时率	=100%	--
	成本指标	菌种厂建设成本	≤799378.98 元	--
室外附属工程成本		≤95355.24 元	--	
效益指标	经济效益指标	增加榆树园村承包收入	≥7.2 万元	--
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥15 户	--
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	--
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥96%	--

（二）项目管理分析

财务管理制度比较为健全，资金支出合规。和硕县曲惠镇人民政府根据《内部财务管理制度》使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。和硕县曲惠镇人民政府有相应的财务管理制度，且合法、合规。

招标过程规范，合同管理完备，但项目资料不完整。和硕县曲惠镇人民政府按规定进行了前期的采购需求论证，并经过专家论证、该县财政局采购办批复确定采购方式为公开

招标，项目程序合法、合规，合同管理规范、完备。但根据调研发现项目资料存在不完整情况，缺少针对此专项的业务管理制度和考核机制的资料。

（三）项目绩效分析

为农户增加收入，提高村级集体经济水平。2021年和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目实施后，有效提高榆树园村菌种厂菌种的培育能力，增加榆树园村承包费收入，每年增加收入7.2万元，榆树园村集体将产生的效益以补贴购买菌包的形式让农户受益，增加蘑菇种植规模，提高贫困户收入，同时还带动了其他乡镇发展食用菌产业。和硕县曲惠镇榆树园村利用林业废料打粉、装包、出菇后，菌包回收到田地生成农业肥料，循环利用。促进了和硕县曲惠镇榆树园村各种资源的优化整合，提高了曲惠镇榆树园村村级集体经济水平。

五、存在问题

1. 绩效目标设置不够完善

根据曲惠镇人民政府所提供的项目目标表显示，本项目绩效目标设置不够完善，存在以下问题：其一是数量指标“安装变压器”指标值“ $\geq 160KV.A$ ”，这里的指标值根据项目实际情况应该应填写数量而不是型号。其二是该项目有采购设备变压器，但项目绩效目标表的产出指标、效益指标与满意度指标并未设置有关采购设备的指标，建议产出指标、效益指标与满意度指标应增加有关采购设备的指标。

2. 档案管理机制不健全

曲惠镇人民政府榆树园村菌种厂二期项目档案管理机制不健全。根据调研发现，2021年度曲惠镇人民政府项目管理过程较规范，但仍然存在个别问题，在曲惠镇人民政府提供的材料中，缺少该项目专项的业务管理制度、考核机制等资料。

六、管理建议

1. 加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标设置合理性不足的问题，建议和硕县曲惠镇人民政府加强项目目标研究和学习，提升绩效目标的管理水平。在项目申报阶段，应认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标；其次，建议和硕县财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，同时主管部门要进一步加大绩效目标的审核力度，提升绩效目标的编制水平。

2. 加强并完善项目档案的管理

建议项目实施单位要严格遵守项目管理制度规定，同时做好资料留存及档案整理工作。根据该单位出现的项目档案机制不健全的问题，建议从以下几个方面完善：其一理顺各部门间相互有序的衔接关系，能够重点加强该单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行；其二规范项目档案标准，项目档案在填写过程中，必须要做到填写标准化，明确各方责任，确保项目档案的完整性，实现项目档案价值，且建立相应的项目档案管理制度，不断提高项目档案管理工

作的标准化建设进程。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由和硕县曲惠镇提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.6分) ②项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.7分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (0.6分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.6分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 (0.6分)	此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;且不重复;此项得满分。	3	100.00%
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (1分)	此项目按照规定的程序申请设立,符合审批要求;此项得满分。	3	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）			
	A2 绩效 目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	评价要点: ①项目是否有绩效目标; (1.25分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (1.25分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1.25分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1.25分)	项目设立了总目标和年度目标; 项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、有明确的时间限制,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,但缺少有关采购设备的指标,故该项扣0.25分;项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平,与预算确定的项目资金量匹配,综上,该项得4.75分。	4.75	95.00%
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1.3分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1.3分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (1.4分)	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,不扣分;绩效指标的绩效指标值设定不够清晰,数量指标“安装变压器”指标值“≥160KV.A”缺乏合理性,这里的指标值应根据项目实际情况填写数量而不是	3.9	97.50%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							(根据设置有误的三级指标条数占总条数的比例扣分。)	型号, 故该项扣除 $1/13 \times 1.3 = 0.1$ 分; 与项目目标任务数相对应, 不扣分; 综上此项得3.9分。		
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; (0.75分) ②预算内容与项目内容是否匹配; (0.75分) ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; (0.75分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (0.75分)	预算编制科学, 预算内容与项目匹配, 预算测算依据充分, 预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。 综上, 此项得3分。	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; (1分) ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)	此项目预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应, 故该项得满分2分。	2	100.00%
B 过	B1	B101 资	5	实际到位资金与	100%	通用	资金到位率= (实际到位资	(89.6 万元/89.6 万元)	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
程 (20)	资金管理 (14)	金到位率		预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		标准	金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。(按比例得分)	×100%=100%。资金到位率100%, 综上该项得满分5分。		
		B102 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。(按比例得分)	该项目2021年预算共89.6万元,实际支出89.32万元,预算执行率(89.32万元/89.6万元)×100%=99.69%, 综上该项得满分5.98分。	5.98	99.69%
		B103 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(0.75分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.75分) ③是否符合项目预算批复	本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续;项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综	3	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							或合同规定的用途；（0.75分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75分）	上，该项得满分3分。		
		B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）	本单位有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上得满分3分。	3	100.00%
	B2 组织实施（6）	B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.75分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.75分）	此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告齐全，但根据调研发现项目缺少针对此专项的业务管理制度和考核机制的资料。故该项扣除一半分数0.37分，项目实施的场地设备、信息支撑已落实到位，综上该项得分2.63分。	2.63	87.67%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
C 产出 (40)	C1 产出数量 (19)	C101 菌种厂建设面积	4	考菌种厂的建设面积	≥300 平方米	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示, 菌种厂建设面积为 300 平方米, 完成率 100%, 故该项得满分 4 分。	4	100.00%
		C102 建设菌种培育架数量	5	考察建设菌种培育架数量	≥44 架	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示, 建设菌种培育架数量 44 架, 完成率 100%, 故该项得满分 5 分。	5	100.00%
		C103 安装 160KV·A 变压器	4	考察安装 160KV·A 变压器	≥1 台	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示, 安装 160KV·A 变压器 1 台, 完成率 100%, 故该项得满分 4 分。	4	100.00%
	C2 产出质量 (9)	C201 项目验收合格率	5	考察项目验收合格率	100%	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低 1%扣除 5%的权重分, 扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示, 项目验收合格率为 100%, 完成率为 100%, 故该项得满分 5 分。	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
	C3 产出时效 (3)	C301 工程(项目)开工时间	4	考察工程(项目)开工时间	2021年3月15日	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分,扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示,该项目实际开工时间为2021年3月15日,完成率100%,故该项得满分4分。	4	100.00%
		C302 工程(项目)完工时间	5	考察工程(项目)完工时间	2021年6月15日	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分,扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示,该项目实际完工时间为2021年6月15日,完成率100%,故该项得满分5分。	5	100.00%
		C303 项目(工程)完成及时率	4	考察项目(工程)完成及时率	100%	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低1%扣除5%的权重分,扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示,该项目完成及时率为100%,达到目标值,故该项得满分4分。	4	100.00%
	C4 产出成本 (9)	C401 菌种厂建设	5	考察菌种厂建设的成本	≤799378.98元	计划标准	低于或达到目标值得满分,超出则不得分。	依据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目支出明细账,2021年和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目菌种厂建设支出797824.55元,低于目标值799378.98万元,完成率	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		C402 室外附属工程	4	考察室外附属工程的成本	≤95355.24 元	计划标准	达到目标值得满分，超出则每超出 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	100%，故该项得满分 5 分。 依据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目支出明细账，2021 年和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目室外附属工程支出 95355.24 元，完成率 (95355.24 元/95355.24 元)*100%=100%，故该项得满分 4 分。	4	100.00%
D 效益 (20)	D1 项目效益 (15)	D101 增加榆树园村承包收入	5	考察增加榆树园村承包收入	≥7.2 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示，此项目增加榆树园村承包收入 7.2 万元，完成率 100%，故该项得满分 5 分。	5	100.00%
		D102 受益脱贫人口数	5	考察受益脱贫人口数	≥15 户	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示，此项目受益脱贫人口数 15 户，完成率 100%，故该项得满分 5 分。	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		D103 工程使用年限	5	考察工程使用年限	≥10 年	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目所提供的佐证材料显示，此项目工程使用年限为 10 年，故该项得满分 5 分。	5	100.00%
	D2 满意度 (5)	D102 受益脱贫人口满意度	5	考察受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 6%的权重分，扣完为止。	根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 97.00%，满意度水平较高。故该项得满分 5 分。	5	100.00%
总分			100	-	-	-	-	-	99.26	99.26%

附件二 数据需求表

序号	政策文件	备注
1	项目立项依据文件（国家、自治区）	
2	项目资金立项程序性文件（可行性研究、专家论证、会议纪要等材料）	
3	2021 本项目的绩效目标	
4	预算明细表	
5	预算资金申请、批复相关文件	
6	专项资金管理办法、其他针对专项资金的财务管理制度	无专项资金管理办法
7	资金下拨文件、资金拨付明细	
8	针对项目的财务检查、定期跟踪报告、财务审计等相关材料	
9	项目财务核算资料（报表、账簿、收付款凭证）	
10	招标文件、中标通知书、项目合同（采购合同）	如不涉及招投标可不提供
11	项目实施方案、跟踪管理制度、验收制度等相关管理制度	
12	项目评审、验收报告	
13	2021 年度本项目监控表、自我评价报告、自评表、总结材料等	
14	2021 年度本项目财务支付明细账	
15	实施单位的职能或三定方案	
16	项目审计报告	如没有可不提供
17	单位基本证照	
18	项目实施组织机构设置	
19	项目产出类指标完成情况的佐证资料 （数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）	如目标不涉及，可不提供
20	项目效益类指标完成情况的佐证资料 （经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标）	如目标不涉及，可不提供
21	本项目现场完成情况的照片	基建类、采购类必须提供，补贴类可不提供。

附件三 访谈报告

相关负责人访谈报告

1. 请您谈谈本单位此项目的背景、内容及规模。

答：曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目是 2021 年，巴财农〔2020〕46 号-新财扶〔2020〕40 号提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金预算项目。该项目资金用于完成 2021 年和硕县曲惠镇榆树园村对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建，包括安装管网电缆，购买型号为 160KV.A 变压器、粉碎机，建设 44 架菌种培育架（菌架单个高 2 米、长 1 米、宽 1 米），新建 300 平方米的发菌室。

2. 请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

答：该项目是扶贫资金，巴财农〔2020〕46 号-新财扶〔2020〕40 号提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金预算项目。该项目使用情况是：第一阶段：按照合同内容施工前支付 30% 资金、第二阶段：开工后支付 40% 资金、第三阶段：施工完成验收后支付 37%、留 3% 质保金。一年后支付质保金。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

答：为确保项目能按计划落实，达到预期目标，成立扶贫项目领导小组。领导小组召开专题会议，坚持问题导向、目标导向、责任导向和严实导向，确保榆树园村菌种二期项目自评工作全覆盖。结合自评工作，按照国家政策和工作要求，进一步明确做好榆树园村菌种二期项目目标方向和遵

循，查找当前工作中存在的问题和不足，立即逐项整改，切实将这项惠民政策转化为民心工程、利民工程、满意工程。

自评工作采用综合分析法进行绩效目标自评，即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评价，同时得出综合结论最终形成自评报告。对 2021 年榆树园村菌种厂二期项目的各项绩效指标完成情况进行跟踪调查。

4. 请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

答：预期目标是为发展壮大集体经济，对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建，包括安装管网电缆，购买型号为 160KV.A 变压器、粉碎机，建设 44 架菌种培育架（菌架单个高 2 米、长 1 米、宽 1 米），新建 300 平方米的发菌室。该项目实施后，可有效提高菌种厂菌种的培育能力，增加榆树园村承包收入，预计每年增加收入 7.2 万元，提高脱贫户分红比例，提高脱贫户收入，同时还可以带动其他乡镇发展食用菌产业。本项目实施后减少贫困户支出，提高脱贫户分红比例，激发脱贫户自我发展动力，在一定程度上解决了脱贫户就业的问题。

5. 请您谈谈该专项实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

答：对项目实施工作在思想上不够，项目申报要求越来越高与专业队伍素质不相适应的矛盾。未来的工作规划是进

进一步加强项目申报人员的专业水平、加强领导、明确专班、建立激励机制。强化责任、明确项目工作职责和程序。

6. 请您具体谈谈项目的管理流程。

答：为了提高项目招投标工作的透明度，保证工程质量和进度，由招标代理机构，在报纸媒体上进行招标公告，根据《招标投标法》向社会公开招投标，公开、公正、公平选用全州范围内市政三级以上资质（含三级）的施工企业进行招标，项目于2021年3月25日开标，中标单位新疆华玺建设工程有限公司，中标价为：893667.02元。施工单位于2021年3月15日进场施工。

该项目于2021年7月31日完工并组织各部门验收审计，最终项目审定价为89.32万元，项目完工后，财政收回该项目结余资金0.28万元，调整年初预算为89.60万元，截至目前支付榆树园村菌种厂二期项目89.32万元，预留3%（2.68万元）的工程质保金未支付，资金执行率99.68%。

7. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。

答：（一）专项资金的预算基础组织工作不到位。（二）在专项资金管理过程中财务控制意识薄弱。提高资金使用效益，加强监督检查、确保专款专用，发挥其应有的使用效果。

8. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

答：该专项资金实施过程中涉及单位是财政局、县乡村

振兴管理局、镇财政所。项目资金按照签订的施工合同，根据施工进度，分三次支付，现项目资金已按照规定支付完毕。

项目资金的支付，先经镇财政所进行审定，然后提交县扶贫办、财政所逐级批复。

9. 具体说说本单位此项目完成后，产生了什么效益？

答：该项目实施后增加村集体经济收入，提高脱贫户分红比例，提高脱贫户收入，同时还可以带动其他乡镇发展食用菌产业。项目建成后是受益贫困户，确保项目资产不闲置。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
曲惠镇人民政府	茹鲜古丽	15899019568	

附件四 满意度调查问卷分析

和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目

满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次调研对象为和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂受益脱贫人口。

(二) 调研内容

1. 单选题:

您的性别是

您看到过榆树园村菌种厂二期项目的公告信息吗?

您觉得榆树园村菌种厂二期项目对您帮助大吗?

据您了解是否有贫困群众参与这个项目?

您是通过哪种方式参与的榆树园村菌种厂二期项目?

2. 满意度问题:

对榆树园村菌种厂二期项目所带来的收益是否满意?

对曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目收益资金分配及时性是否满意?

您对2021年曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目的整体评价

榆树园村菌种厂二期项目的受益脱贫人口是否满意

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前

先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的随机抽样方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查共回收有效问卷 10 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目满意度调查问卷的信度为 0.92。

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系; $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关; $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关, 其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关, $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关, $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关, $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明, 此次问卷效度较高, 因此能够很好地反映的满意程度, 有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对 2021 年曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目的整体评价	0.94
对榆树园村菌种厂二期项目所带来的收益是否满意?	0.88
对曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目收益资金分配及时性是否满意?	0.94
榆树园村菌种厂二期项目的受益脱贫人口是否满意	0.88

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别是

在 10 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 40%，选女的比例为 60%。

2) 您看到过榆树园村菌种厂二期项目的公告信息吗？

在 10 份有效问卷中，被调查对象中选看到过的比例为 90%，选没看到的比例为 10%。

3) 您觉得榆树园村菌种厂二期项目对您帮助大吗？

在 10 份有效问卷中，被调查对象中选很大的比例为 100%，选一般的比例为 0%。

4) 据您了解是否有贫困群众参与这个项目？

在 10 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%，选不清楚的比例为 0%。


5) 您是通过哪种方式参与的榆树园村菌种厂二期项目？

在 10 份有效问卷中，被调查对象中选分红收益的比例为 90%，选到户补助的比例为 10%，选务工的比例为 0%，选合作经营的比例为 0%。

2. 满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 97.00%，满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：对榆树园村菌种厂二期项目所带来的收益是否满意？（98%）、对曲惠镇榆树园村菌种厂二期项

目收益资金分配及时性是否满意？（96%）、您对2021年曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目的整体评价（96%）、榆树园村菌种厂二期项目的受益脱贫人口是否满意（98%）。具体如下图所示。

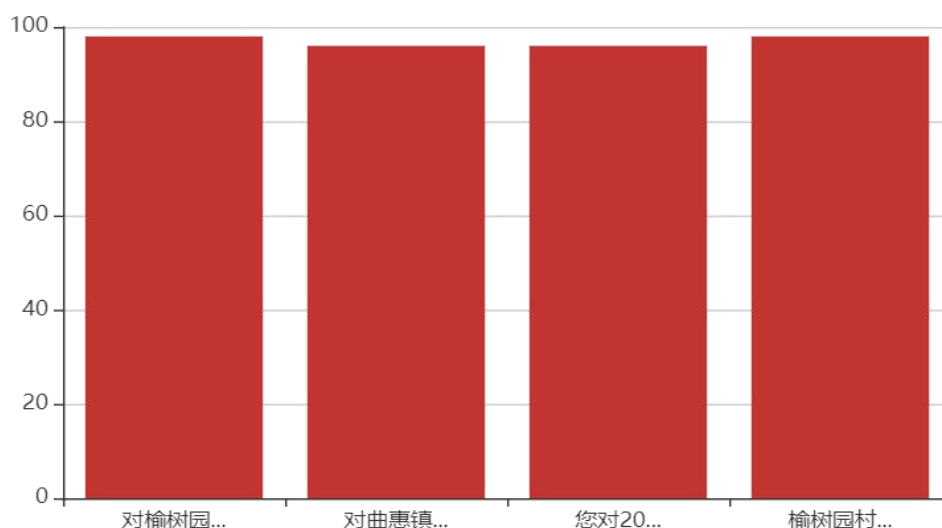

六、意见及建议

根据问卷调查显示，本次曲惠镇人民政府榆树园村菌种厂二期项目受益脱贫人口满意度为 97.00%。

附件五 满意度调查问卷



和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目满意度调查问卷

1: 您的性别是

A:男

B:女

答案: _____

2: 您看到过榆树园村菌种厂二期项目的公告信息吗?

A:看到过

B:没看到

答案: _____

3: 您觉得榆树园村菌种厂二期项目对您帮助大吗?

A:很大

B:一般

答案: _____

4: 据您了解是否有贫困群众参与这个项目?

A:是

B:否

C:不清楚

答案: _____

5: 您是通过哪种方式参与的榆树园村菌种厂二期项目?

A:分红收益

B:到户补助

C:务工

D:合作经营

答案: _____

6: 对榆树园村菌种厂二期项目所带来的收益是否满意?

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案: _____

7: 对曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目收益资金分配及时性是否满意?

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案: _____

8: 您对2021年曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目的整体评价

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案: _____

9: 榆树园村菌种厂二期项目的受益脱贫人口是否满意

A:1分

B:2分

C:3分

D:4分

E:5分

答案: _____

附件六 现场照片

1.菌种厂现场施工图



2.菌种厂完工，验收合格

